

**FINAUTO istorija:
nuo pirkimo iki
veikiančios inovacijos**



AUKŠČIAUSIOJI
AUDITO INSTITUCIJA

Inovacijų patarėja
Venera Michalovska

Kokia problema?

- Rankinis duomenų gavimas iš išorės sistemų
- Duomenų tvarkymas atskiruose excel failuose
- Gaunamų PDF dokumentų gausa
- Rankinis duomenų sutikrinimas

1 etapas

FINAUTO prototipas, 2024 m.

2 etapas

Migravimas į gamybą, 2025 m.

1 etapas – FINAUTO prototipas

- 2024 m. birželis/liepa – tehninės specifikacijos ir pirkimo dokumentacijos rengimas
- 2024 m. liepa/rugpjūtis – viešojo pirkimo įgyvendinimas
- 2024 m. rugsėjis/lapkritis – prototipo kūrimas, testavimas
- 2024 m. gruodis – priėmimas

1 etapas – FINAUTO prototipas

Techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentacijos rengimas

- *Sudaroma projekto komanda*: įtrauktos visos suinteresuotos šalys (veiklos atstovai – finansiniai auditoriai, IT ir viešųjų pirkimų specialistai)
- *Poreikių identifikavimas*: funkciniai reikalavimai, techniniai reikalavimai, reikalavimai dokumentacijai, kt.
- *Specifikacijos projekto peržiūra*: aptarimas, norų mažinimas, galutinis susitarimas
- *Galutinis rezultatas*: parengta supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentacija

1 etapas – FINAUTO prototipas

Viešojo pirkimo įgyvendinimas

- *Viešojo pirkimo komisija*: atlieka pirkimo procedūras
- *Vertinimo komisija*: vertina 5 gautus projekto pasiūlymus – sprendinio koncepcijas, parengia recenzijas (kriterijai – idėjos originalumas, atitiktis poreikiams ir problematikai, funkcionalumas ir plečiamumo galimybės, vartotojo sąsaja, saugumo užtikrinimas)
- *Laimėtojai ir prizai*: pasirašoma pirkimo sutartis, išmokami piniginiai prizai I-III vietas laimėtojams

1 etapas – FINAUTO prototipas

Prototipo kūrimas, testavimas

- *Darbo pradžia*: susipažinimas su tiekėju, detalesnė reikalavimų analizė, darbo programuoti sąlygų sudarymas, prieigų prie išorės testinių aplinkų organizavimas
- *Prototipo kūrimas*: kas savaitiniai susitikimai su tiekėju, darbo rezultatų pristatymas, išskylusių neaiškumų aptarimas/sprendimas, rizikų valdymas
- *Priėmimo testas*: sudaroma auditorių testuotojų komanda, testuojami funkciniai reikalavimai, prototipo priėmimas

2 etapas – Migravimas į gamybą

- 2025 m. vasaris – techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentacijos rengimas
- 2025 m. kovas – viešojo pirkimo įgyvendinimas
- 2025 m. balandis/birželis – FINAUTO migravimas, testavimas, diegimas
- 2025 m. liepa – priėmimas, mokymai

FINAUTO

FINAUTO



INSURANCE



FINO Growth




Automatizuotas
duomenų gavimas





PDF duomenų
nuskaitymas

Kryžminis
duomenų
sutikrinimas



Neatitikčių ataskaitos






El. paštas

Prisijungti

Finansų ministerijos duomenų šaltiniai

FINAUTO

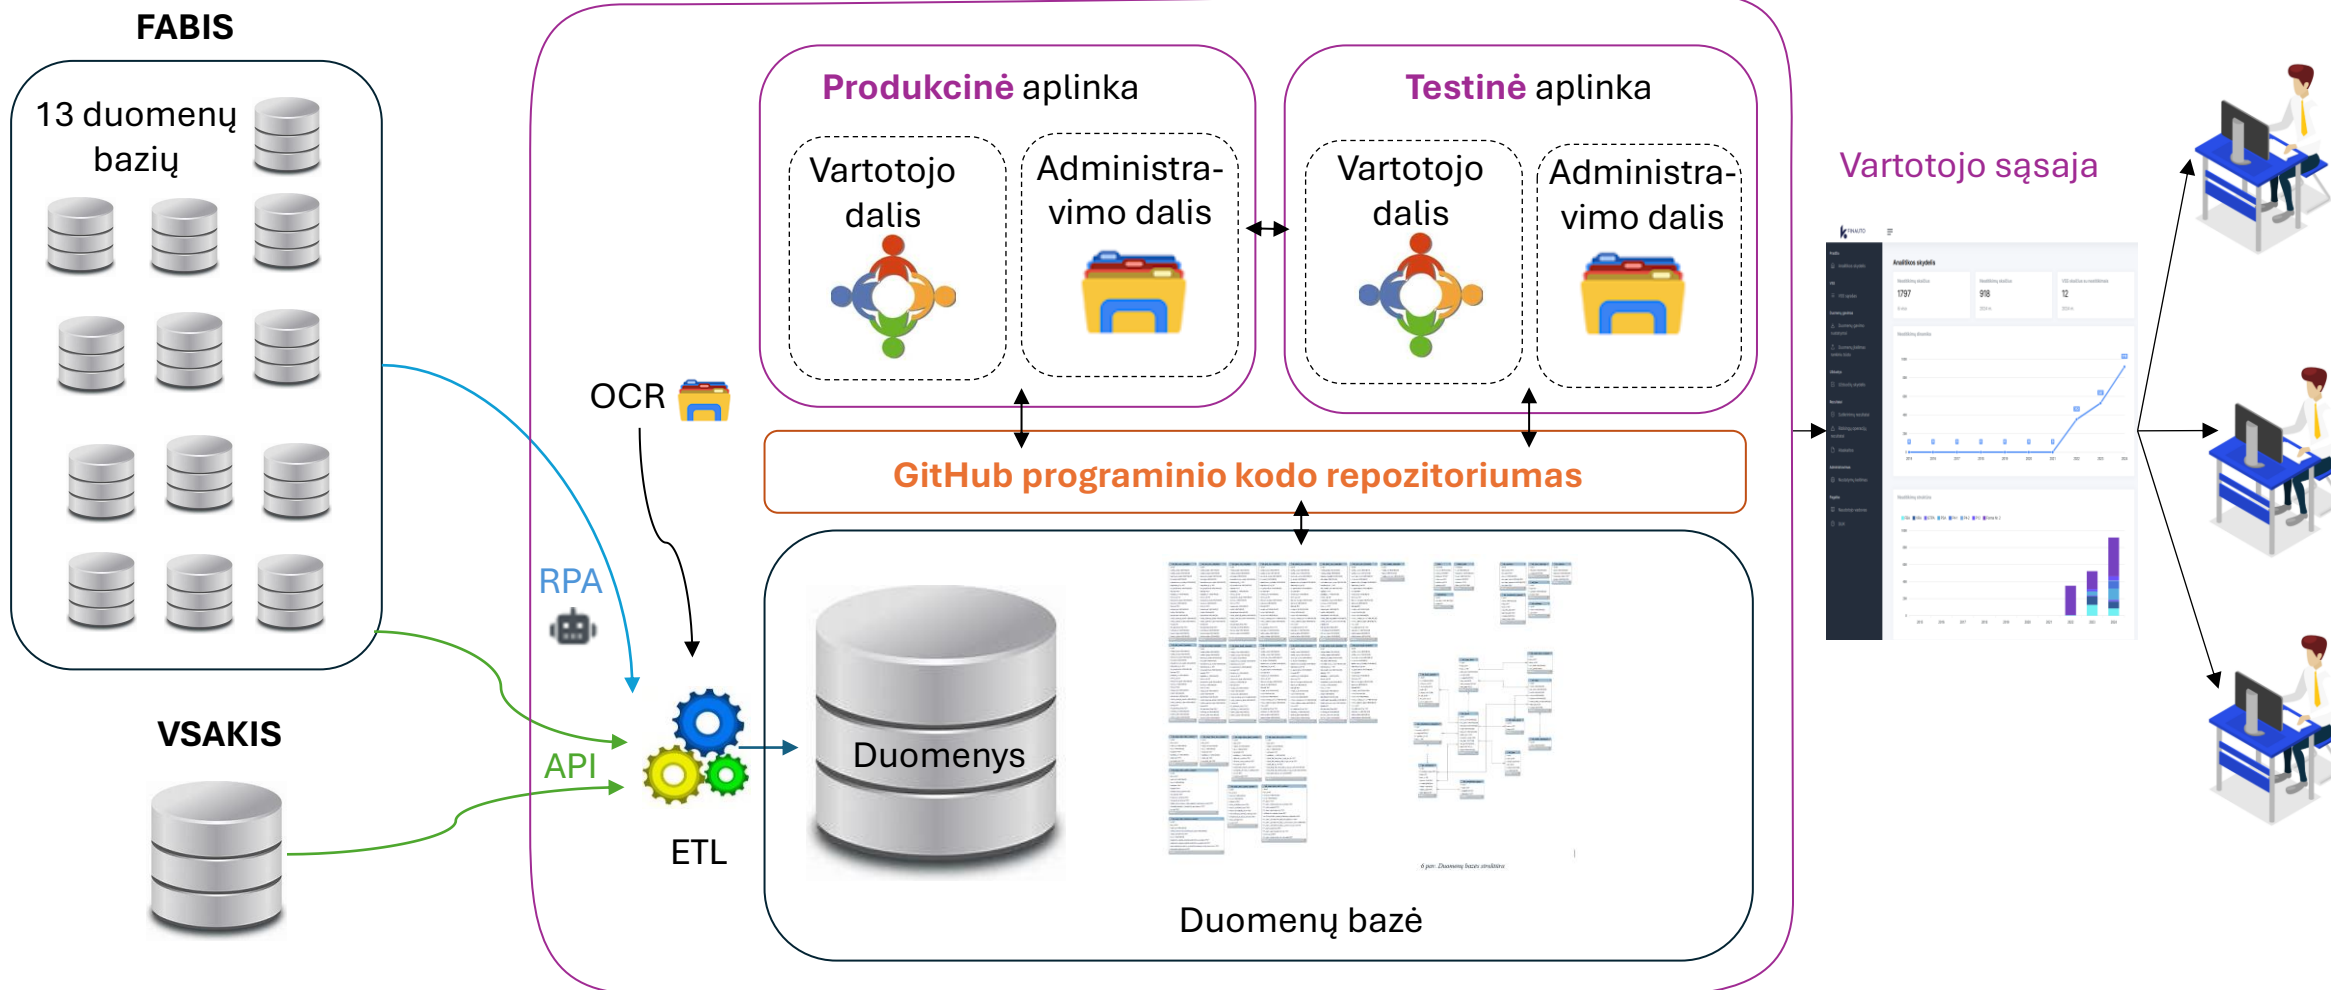

Kertinis tinklas (KVTC) – duomenų perdavimas

Vystymo projektai:

Rizikingų operacijų identifikavimas
2025 – gruodis (vykdomas)

Reikšmingų apskaitos sričių atrankos
automatizavimas
2026 – gruodis (planas)

SODROS ir VLK duomenų gavimo ir sutikrinimų
automatizavimas
2026 – 2027 (planas)

A č ĭ ū
